



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๑๑๘๒

ที่... นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ ๖๕๙ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ศกษย)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

ผ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวพนทิพย์ วรรณฤตินะ)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๒ โครงการ/รายการ (ต่อมาได้มีการผนวกรวมโครงการ ๒ โครงการ เข้าด้วยกัน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙๒,๔๘๑,๒๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ ตัวชี้วัด (ต่อมาได้มีการยกเลิกตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด)

๑.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) สรุปได้ ดังนี้

๑.๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙๒,๗๒๒,๖๐๐ บาท โดยมียอดเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐,๓๙๐,๗๘๒.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับ

๑.๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ ๓.๔๖ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) เพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒,๖๘๕,๒๐๐ บาท ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒ โครงการ โดยมียอดเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๙๒,๕๘๒.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๓ ของงบประมาณที่ได้รับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


สถานะโครงการ	รายละเอียด
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว	จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค. (เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๙๒,๕๘๒.๘๑ บาท)
ชะลอโครงการ	จำนวน ๑๑ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(เอกสารแนบ ๑) (ตารางภาพที่ ๑)


๒.๑.๒ รายการ ...

สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)


ตารางภาพที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 โครงการ

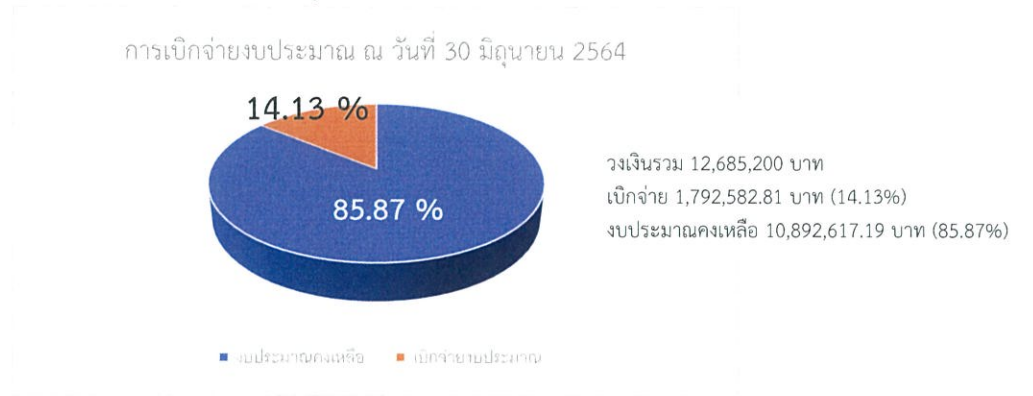

ตารางภาพที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 รายการ

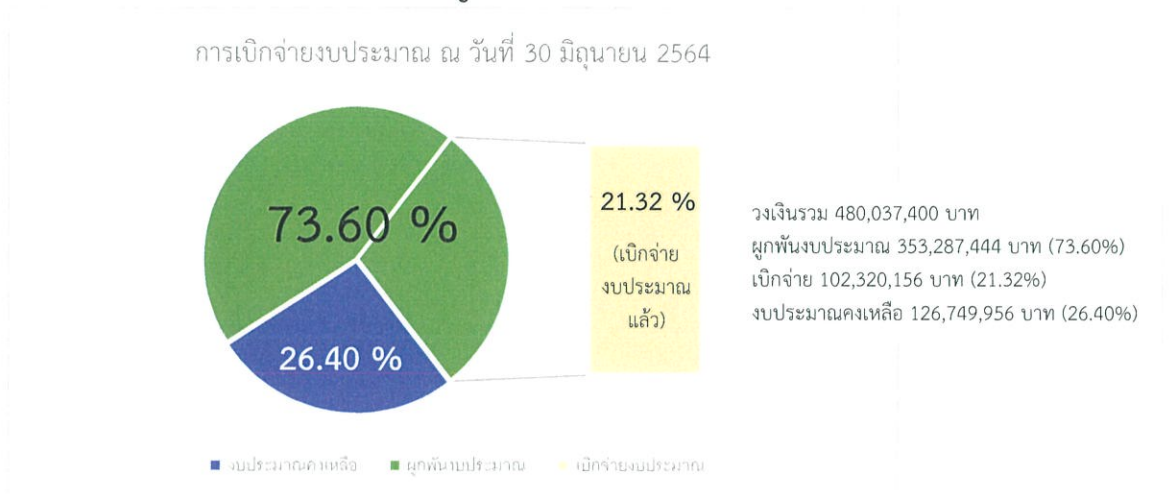

ตารางภาพที่ 3 : ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24 ตัวชี้วัด

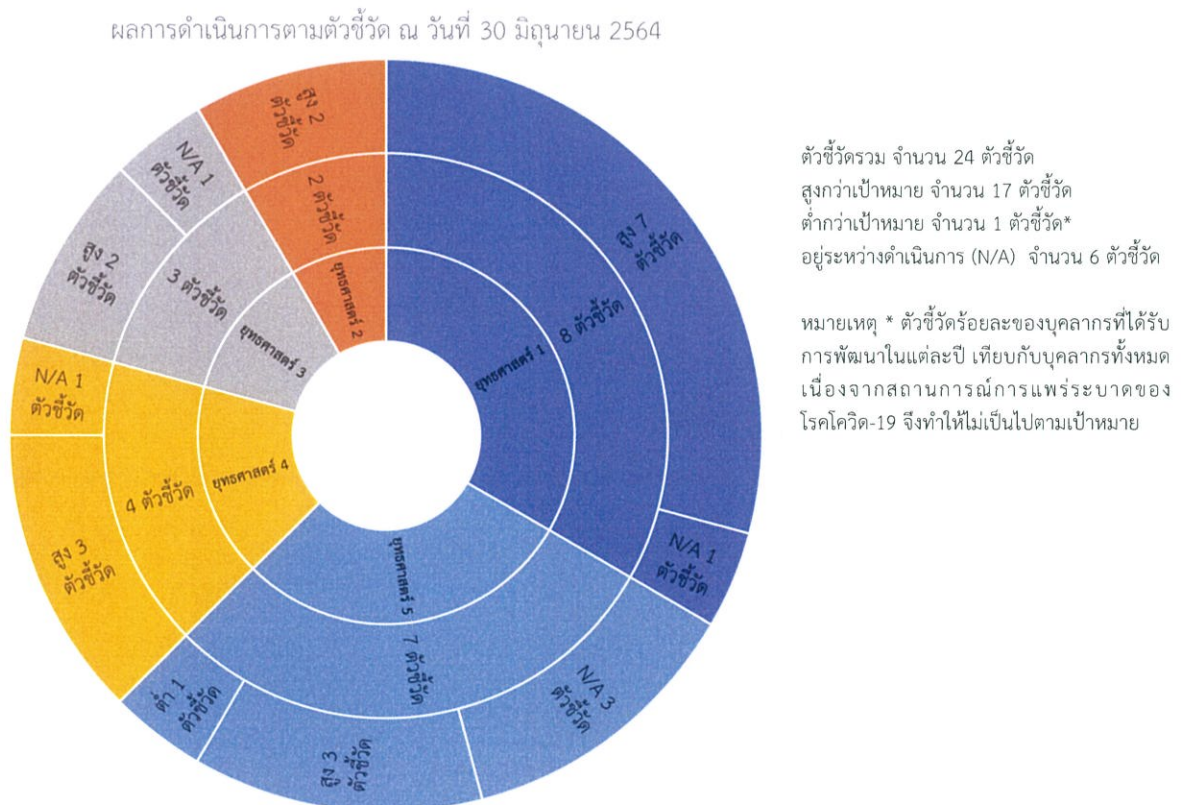

สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	กนธ.	๓๙๑,๐๐๐	-	๓๙๑,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี”	กวกค.	๑๘๗,๕๐๐	-	๑๘๗,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ (กำหนดสัมมนาในเดือน ส.ค. ๖๔)
๓	โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปค. กบส.	๕๙๔,๖๐๐	-	๕๙๔,๖๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	กคอ.	๓๐,๓๐๐	-	๓๐,๓๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๕	โครงการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี	กสค.	๒๖๒,๕๐๐	-	๒๖๒,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๖	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอกค.	๑๑๒,๕๐๐	-	๑๑๒,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๗	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	๗,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๖,๒๐๔.๖๗	๖,๔๑๓,๗๙๕.๓๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร	สสธ.	๙๗๘,๐๐๐	-	๙๗๘,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๙	โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท	สสธ.	๘๖๐,๐๐๐	-	๘๖๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สสธ.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๑	โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	กบส.	๑๒๕,๕๐๐	-	๑๒๕,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๒	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สสค.	กพร.	๑,๕๓๘,๓๐๐	๗๐๖,๓๗๘.๑๔	๘๓๑,๙๒๑.๘๖	ชะลอการดำเนินการ ๑ กิจกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ กิจกรรม)
๑๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สสค.	ศปท.	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
รวม			๑๒,๖๘๕,๒๐๐	๑,๗๙๒,๕๘๒.๘๑	๑๐,๘๙๒,๖๑๗.๑๙	

หมายเหตุ : โครงการลำดับที่ ๑๒ ลคร. อนุมัติให้เพิ่มงบประมาณโครงการ จากเดิม จำนวน ๑,๑๒๓,๙๐๐ บาท เป็น ๑,๕๓๘,๓๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๑๔,๔๐๐ บาท)

การจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณโครงการ* (บาท)	งบประมาณหลังการได้รับ/เพิ่ม/โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี	สสธ. กบส.	๙๑๔,๙๐๐	๙๑๔,๙๐๐	-	-	๙๑๔,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย - ๒ ก.ค. ๖๔
๒	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอก.	๔๑๕,๗๔๕,๐๐๐	๓๓๖,๙๔๓,๔๐๐	๒๗๙,๒๗๙,๐๐๐	๘๒,๗๖๕,๐๐๐	๕๗,๖๖๔,๔๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญาจำนวน ๔ สัญญา
๓	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอก.	๔๑,๖๔๘,๐๐๐	๑๒๐,๓๗๐,๐๐๐	๕๒,๓๐๐,๐๐๐	๑๕,๘๕๐,๐๐๐	๖๘,๐๗๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญาจำนวน ๒ สัญญา
๔	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร	กอก.	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๙๗,๘๔๔	๑,๕๖๕,๑๙๖	๒,๑๕๖	กำหนดส่งมอบงานจำนวน ๓ งวด โดยส่งมอบงานแล้ว ๒ งวด
๕	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร - งบประมาณ ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท - ปี ๖๔ จำนวน ๑,๙๒๖,๐๐๐ บาท - ปี ๖๕ จำนวน ๖,๖๕๔,๐๐๐ บาท	กบส. กอก.	๙,๖๓๐,๐๐๐	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑,๙๒๖,๐๐๐	-	-	คกก. ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒
๖	โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กบส. กอก.	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๕๗๙,๖๐๐	๔,๕๗๙,๖๐๐	๔๕๗,๙๖๐	-	คกก. ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบงานงวดที่ ๒
๗	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา - งบประมาณ ๖,๗๘๙,๑๐๐ บาท - ปี ๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปี ๖๕ จำนวน ๔,๗๘๙,๑๐๐ บาท	กบส. กอก.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔
๘	โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ	กบส. สสธ.	๔,๙๗๕,๕๐๐	๔,๓๐๓,๕๐๐	๔,๒๐๕,๐๐๐	๑,๖๘๒,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	คกก. ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบงานงวดที่ ๓
รวม			๔๙๖,๙๑๓,๔๐๐	๔๘๐,๐๓๗,๔๐๐	๓๕๓,๒๘๗,๔๔๔	๑๐๒,๓๒๐,๑๕๖	๑๒๖,๗๔๙,๙๕๖	

หมายเหตุ * งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด						
ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	เท่ากับเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	๘	๗	-	-	๑	ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล คือ • ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย	๒	๒	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	๓	๒	-	-	๑	ตัวชี้วัด ๓.๑.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ จำนวน ๑ เรื่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา	๔	๓	-	-	๑	ตัวชี้วัด ๔.๑.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง	๗	๓	-	๑	๓	ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบแผนงานที่กำหนด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล จึงทำให้ยังไม่ทราบผลตัวชี้วัด (N/A) และทำให้บางตัวชี้วัดมีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินโครงการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ		
1. โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (กนธ.) - งบประมาณ 391,000 บาท	กำหนดสัมมนาในวันที่ 21 - 22 พ.ค. 64 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี” (กวค.) - งบประมาณ 187,500 บาท	กำหนดสัมมนาในเดือน ส.ค. 64 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-
3. โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค. กบส.) - งบประมาณ 594,600 บาท	เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 ให้ กปค. และ กบส. เลื่อนการดำเนินโครงการออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	-
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.) - งบประมาณ 30,300 บาท	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 1 โครงการ		
5. โครงการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) - งบประมาณ 262,500 บาท	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จำนวน 2 โครงการ		
6. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (กอค.) - งบประมาณ 112,500 บาท	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
7. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.) ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก - งบประมาณ 7,500,000 บาท	1. อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นำไปใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตสำนึก ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.1.1 กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝึกรับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธรูปมหามณีรัตน์ปฏิมากร - พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นฤดูหนาวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63 56,937 - พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 64 44,380 1.1.2 กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝึกรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ (1) จัดกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้นักเรียนทุนฯ - เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 78,680 - เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 - 5 ธ.ค. 63 79,054 - เนื่องในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 64 16,800 - เนื่องในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 273,349 (2) จัดนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 63	1,086,204.67

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา		
-ไม่มีโครงการ-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 โครงการ		
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสตุสารบรรณ และด้านบุคลากร (สสธ.) - งบประมาณเดิม 450,000 บาท - ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 978,000 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-
9. โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท (สสธ.) - งบประมาณเดิม 630,000 บาท - ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 860,000 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-
10. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สสธ.) - งบประมาณ 30,000 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-
11. โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.) - งบประมาณ 125,500 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.1 การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation in government) 1.2 การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) 1.3 การออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยดิจิทัล 1.4 การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น	-

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สธธ. กอค.) - งบประมาณเดิม 41,648,000 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 120,370,000 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 52,300,000 บาท	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณ ตามสัญญา จำนวน 2 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,300,000 บาท ประกอบด้วย 1. จัดจ้างกรมธนารักษ์ จำนวน 1 สัญญา ได้แก่ - สัญญา 55/2564 จำนวน 31,700,000 บาท จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จำนวน 15,850,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64 2. จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน 1 สัญญา ได้แก่ - สัญญา 57/2564 จำนวน 20,600,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64	15,850,000
4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ (กอค.) - งบประมาณ 9,000,000 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 8,997,844 บาท	ลงนามในใบสั่งจ้างกับสำนักพิมพ์ฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 497/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 วงเงิน 8,997,844 บาท ประกอบด้วย 1. กระดาษสัญญาบัตรตราตั้งกงสุล (กระดาษบาง) จำนวน 400 ฉบับ - กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 มี.ค. 64 (ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64) 2. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10 (พิมพ์เฉพาะที่ 5 จุด) จำนวน 250,000 ฉบับ - กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 เป็นเงิน 4,280,000 บาท 3. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10 (แบบหัวเปล่า) จำนวน 151,600 ฉบับ กำหนดส่งมอบงาน จำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 จำนวน 50,000 ฉบับ (ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64) - ครั้งที่ 2 กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 จำนวน 101,600 ฉบับ เป็นเงิน 3,152,648 บาท	1,551,500

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
5. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (กบส. กอค.) - งบประมาณ 8,580,000 บาท ปี 64 จำนวน 1,926,000 บาท ปี 65 จำนวน 6,654,000 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 58/2564 ลงวันที่ 23 ก.พ. 64 กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 8,580,000 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 5 งวด ดังนี้ 3.1 งบประมาณปี 64 จำนวน 2 งวด เป็นเงินจำนวน 1,716,000 บาท - งวดที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 429,000 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 21 ก.ย. 64 จำนวน 1,287,000 บาท 3.2 งบประมาณปี 65 จำนวน 3 งวด เป็นเงินจำนวน 6,864,000 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 64 จำนวน 2,574,000 บาท - งวดที่ 4 วันที่ 19 เม.ย. 65 จำนวน 2,574,000 บาท - งวดที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย. 65 จำนวน 1,716,000 บาท 4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 4.2 บริษัทฯ ได้เข้ามาศึกษาระบบทะเบียนฐานันดร (ระบบเดิม) ในภาพรวม เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมออนไลน์ตรวจรับงานฯ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ 2	-

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
6. โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กบส. กอค.) - งบประมาณเดิม 5,000,000 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,579,600 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 4,579,600 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 53/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 4,579,600 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 4 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 64 จำนวน 457,960 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย. 64 จำนวน 1,373,880 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 31 ก.ค. 64 จำนวน 1,831,840 บาท - งวดที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 64 จำนวน 915,920 บาท 4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 4.2 บริษัทฯ ได้ประชุมฯ เพื่อศึกษาความต้องการตาม TOR กับผู้ใช้งาน กอค. จำนวน 4 ครั้ง 4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2	457,960 457,960
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา		
7. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา (กบส. กอค.) - งบประมาณ 6,789,100 บาท - ปี 64 จำนวน 2,000,000 บาท - ปี 65 จำนวน 4,789,100 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 60/2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64 กับบริษัท พีเคเอ็ม คอลล์ดิง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 6,789,100 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 5 งวด ดังนี้ 3.1 งบประมาณปี 64 จำนวน 2 งวด เป็นเงินจำนวน 1,357,820 บาท	-

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	- งวดที่ 1 วันที่ 30 พ.ค. 64 จำนวน 678,910 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 28 ส.ค. 64 จำนวน 678,910 บาท 3.2 งบประมาณปี 65 จำนวน 3 งวด เป็นเงินจำนวน 5,431,280 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 26 พ.ย. 64 จำนวน 2,036,730 บาท - งวดที่ 4 วันที่ 25 เม.ย. 65 จำนวน 2,715,640 บาท - งวดที่ 5 วันที่ 22 ต.ค. 65 จำนวน 678,910 บาท 4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 4.2 บริษัทฯ ประชุมสอบถามความต้องการ จากผู้ใช้งาน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุม ออนไลน์ตรวจรับงานฯ งวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ 2	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง		
8. โครงการปรับปรุงระบบวันลา และระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ (กบส. สลธ.) - งบประมาณเดิม 4,975,500 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,303,500 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 4,205,000 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนาม ในสัญญาจ้างเลขที่ 52/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 กับบริษัท พายชอฟท์ จำกัด ในวงเงิน 4,205,000 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 4 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 วันที่ 3 มี.ค. 64 จำนวน 420,500 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 2 พ.ค. 64 จำนวน 1,261,500 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 2,102,500 บาท - งวดที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 64 จำนวน 420,500 บาท	1,682,000

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 420,500 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,261,500 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3	
	รวมเบิกจ่าย	102,320,156

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี									
๑.๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ถูกต้อง ๑,๕๔๓ จาก ๑,๕๔๓ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒.๑ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ต่ำกว่า ๘.๗๕	-	-	-	๘.๗๕	ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	N/A	N/A
๑.๒.๒ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๓๓๒ จาก ๓๓๒ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๙.๗๐ (จำนวน ๖๖๘ จาก ๖๗๐ เรื่อง)	๕	๐.๑๕
๑.๓.๑ จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)	๔	๑ เรื่อง	-	-	-	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๕	๐.๒๐
๑.๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	๓	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๔๖ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ เรื่อง สามารถประกาศใช้บังคับได้ทันทุกเรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา ๑ เรื่อง)	๕	๐.๑๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๑.๔.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงาน ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๔.๗๕ (ค่าความพึงพอใจ ๔.๗๔ คะแนน)	๕	๐.๑๕
๑.๔.๒ จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	๓	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำเป็น/เร่งด่วน ๓๙ ครั้ง ทันทุกครั้ง)	๕	๐.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย									
๒.๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงาน ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)	-	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	(ยกเลิกตัวชี้วัด)	-	-
๒.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตาม ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	๑๐	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ประสาน/ติดตาม ๒ เรื่อง จาก ๒ เรื่อง)	๕	๐.๕๐
๒.๒.๑ จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผล การดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	๑๐	๔ เรื่อง/ไตรมาส	๕ เรื่อง/ไตรมาส	๖ เรื่อง/ไตรมาส	๗ เรื่อง/ไตรมาส	๘ เรื่อง/ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น ๒๓ เรื่อง แบ่งเป็น จัดทำใหม่ ๘ เรื่อง ปรับปรุง ๑๕ เรื่อง	๔	๐.๔๐
๒.๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)	-	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	(ยกเลิกตัวชี้วัด)	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์									
๓.๑.๑ จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จากการ ปฏิบัติงานหน้า พระที่นั่ง ๒ ครั้ง)	๕	๐.๓๐
๓.๑.๒ จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณา ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (ไม่มีข้อผิดพลาด จากจำนวนที่ขอฯ ๖๔๕ ครั้ง)	๕	๐.๓๐

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๓.๑.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ ในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด (กอก.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ/ ปรับปรุงคู่มือ จำนวน ๑ เรื่อง	N/A	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา									
๔.๑.๑ จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำนวน ๕๕๔ ครั้ง ๒๑,๔๔๘ เรื่อง ทั้งหมดครั้ง)	๕	๐.๒๐
๔.๑.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๑ เรื่อง)	N/A	N/A
๔.๒.๑ ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๒๕ เรื่อง จาก ๒๕ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๔.๓.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูล ผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอก.)	๓	ร้อยละ ๑	ร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓๑.๑๒ (ผู้ใช้งานปี ๖๔ ๑,๖๙๖,๐๐๘ ผู้ใช้งานปี ๖๓ ๑,๒๙๓,๔๗๑)	๕	๐.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง									
๕.๑.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง หรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส., กพร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน ๔ เรื่อง จาก ๔ เรื่อง)	๕	๐.๑๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๕.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีเทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	๓	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๕๔.๗๔ (พัฒนาบุคลากร จำนวน ๒๒๕ จาก ๔๑๑ คน)	๑	๐.๐๓
๕.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.) (๑) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สธค.	๔	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากรไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากรแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	N/A	N/A
๕.๒.๔ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชวอนามัย ความปลอดภัย (สธธ.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	จัดทำแผน ความปลอดภัย แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน	N/A	N/A
๕.๒.๕ ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร.,กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการ ประเมินตาม เกณฑ์ที่กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	๕	๐.๑๕
๕.๒.๗ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๐
๕.๓.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการ ประเมินตาม เกณฑ์ที่สำนัก งาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	อยู่ระหว่างรอผล การประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช.	N/A	N/A
									๓.๗๘
