ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ลงมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (กนกพร), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา
องค์กรอิสระ, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๓๐๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๔๗๕๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒๒๗๙๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๓๗๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๖. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๒๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๓๐๒

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๒๑๕๙๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๔๑๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๖๓๙๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

/๒. เรื่องเดิม...

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๒๙๐.๗๓๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๗๐๙.๒๖๒๖ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	**๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐**	**๖๓,๓๙๘.๙๖๒๑**	**๕๑**	**๔๙๙.๐๒๘๙**	**๕๙,๐๓๓.๔๙๒๓**	**๙๓.๑๑**
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๔๙.๙๙๐๒	๗๔.๔๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๘๗.๗๖๘๕	๑๔		๙,๔๘๘.๔๙๐๘	๙๖.๙๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๖๑๒.๐๒๓๕	๙๔.๙๕
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๒๐**	**-**	**๗๐๔,๗๔๙.๗๑๙๖**	**๙๙.๓๙**
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๗.๕๐๔๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๑๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗**	**๒๐๙,๘๓๒.๗๕๓๐**	**๑,๐๒๓**	**๑๗,๒๑๐.๒๓๓๗**	**๑๘๖,๔๑๐.๕๑๐๖**	**๘๘.๘๔**
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๕๖.๘๘๓๖	๙๒.๙๘
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๐๖๓.๖๕๓๒	๙๙๑		๘,๘๙๓.๐๒๗๑	๘๐.๓๘
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๕๐๕.๙๐๔๘	๘๘.๕๘
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๖,๖๕๔.๖๙๕๑	๙๓.๓๐
รวมทั้งหมด	**๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐**	**๙๘๒,๒๙๐.๗๓๗๔**	**๑,๐๙๔**	**๑๗,๗๐๙.๒๖๒๖**	**๙๕๐,๑๙๓.๗๒๒๕**	**๙๖.๗๓**

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย **ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕** หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว **วงเงินรวม ๙๕๐,๑๙๓.๗๒๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๕๙ โครงการ จาก ๑,๐๙๔ โครงการ)** ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

/คณะกรรมการฯ...

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ**โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการฯ) ของ มช. อว.** กรอบวงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

๒) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติให้ มช. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ **จากเดิม**สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **เป็น**สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ มช. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **จากเดิม**สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ **เป็น**สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของผู้ป่วย COVID-๑๙ อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วย COVID-๑๙ อาการหนัก (เคสสีแดง) ที่ต้องเข้ารับบริการจากหอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำรูปแบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ (Specifications) และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดทำรูปแบบรายการละเอียด การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้ชี้แจง (ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑) ที่ผ่านมา รพ. ประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักโควิด (ผู้ป่วยสีแดง) ออกจากพื้นที่โครงการฯ ประกอบกับการก่อสร้างห้อง ICU Mudular เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยเดิม ซึ่ง รพ. ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นั้น มีความล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยแล้วเสร็จและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอด

/๑.๒) อย่างไรก็ตาม...

๑.๒) อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอดฯ Negative pressure แล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๑๕๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือประมาณ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยกำหนดแผนส่งมอบงานและเบิกจ่าย จำนวน ๓ งวดงาน ซึ่งจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดแรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับวงเงินตามงวดงานที่สองและงวดงานที่สาม วงเงินประมาณ ๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖ โดยจะเป็นรายการเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบทางเดินท่ออากาศ

๑.๓) อย่างไรก็ดี รพ. จะรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ โดยจะประสานหารือกับผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รพ. จะพิจารณาแหล่งเงินอื่น ๆ ต่อไป

๒) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง แล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินโครงการเป็นการใช้จ่ายจากแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการที่มีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ รพ. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรณีที่ รพ. ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาดังกล่าว เห็นควรให้ รพ. พิจารณาใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่น ๆ ต่อไป

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ <u>จากเดิม</u> สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง เห็นควรมอบหมายให้ มช. เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ **อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ มช. ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เห็นควรให้ มช. พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ** ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เห็นควรให้ มช. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ จังหวัด (ราชบุรี และเชียงใหม่)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

/ความเข้มแข็ง...

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๒ จังหวัด (ราชบุรี และเชียงใหม่) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ**โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด** (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ **กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท** โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ **ซึ่งรวมถึงโครงการของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่**

๒) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔๐๙ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๐,๗๕๒๕ บาท **<u>จากเดิม</u>**สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ **<u>เป็น</u>**สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำหรับกลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้างหรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยกเลิกโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๖๗๐ ล้านบาท		
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙-บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	๖.๘๙๕๐	**ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน <u>จากเดิม</u>**ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ **<u>เป็น</u>**ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจรถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๖.๕๗๒๐	**ขอยกเลิกโครงการ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๑๖๕๖ ล้านบาท		
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าแพะขวาง ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอนบ้านต๋ม-บ้านน้ำบุ่น (ชม.ถ.๑๒๓-๐๓) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑.๑๖๕๖	**ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน**จากเดิมที่กำหนดให้ผูกพันและลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

/๒) วันที่ ...

๒) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยกเลิกโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่ จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒.๒๒๖๐ ล้านบาท		
๑. โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์บริเวณสายป่าไก่-ปากสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๐.๖๖๖๐	**ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕** โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการและไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ส่งผลทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท เป็น ๐.๖๐๑๙ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๖๔๑ ล้านบาท)**
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพรหมนิมิต หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๑.๕๖๐๐	**ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕** โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการและไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ส่งผลทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท เป็น ๑.๔๘๓๑ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๗๖๙ ล้านบาท)**
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๔.๙๖๘๐ ล้านบาท		
๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาเปลี่ยนท่อเมนมิเตอร์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ซับเมอร์ส เจาะบ่อดาล จำนวน ๒ บ่อ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๓.๕๐๐๐	**ขอยกเลิกโครงการ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอน
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งแผงโซล่ารูฟ บ้านแพะคือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๑.๔๖๘๐	

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ดังนี้

/๑.๑) โครงการ ...

๑.๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ. ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๖.๘๙๕๐ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจาก**เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็น**เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๒)โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์บริเวณสายป่าไก่-ปากสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕ ไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ และไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลง**จากเดิม **๐.๖๖๖๐ ล้านบาท** เป็น **๐.๖๐๑๙ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๖๔๑ ล้านบาท)**

๑.๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพรหมนิมิต หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท **โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕** โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ และไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท เป็น ๑.๔๘๓๑ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๗๖๙ ล้านบาท)**

๑.๔) ยกเลิก**โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๖.๕๗๒๐ ล้านบาท** เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๒) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกการดำเนินโครงการ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบประปาเปลี่ยนท่อเมนมิเตอร์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ซับเมอร์ส เจาะบ่อดาล จำนวน ๒ บ่อ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินรวม ๓.๕๐๐๐ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งแผงโซล่ารูฟ บ้านแพะคือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินรวม ๑.๔๖๘๐ ล้านบาท เนื่องจากยังไม่เริ่มดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๓) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน **สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าแพะขวาง ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอนบ้านต๋ม-บ้านน้ำบุ่น (ชม.ถ.๑๒๓-๐๓) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงิน ๑.๑๖๕๖ ล้านบาท** เนื่องจากได้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว เห็นควรมอบหมายให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ **อนุมัติให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่** โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ

๔.๒ **อนุมัติให้จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่** เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการและยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อ ๓.๒.๓

๔.๓ **มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่** เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๓๐๐ **วันที่** ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๒๙๐.๗๓๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๗๐๙.๒๖๒๖ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๓๙๘.๙๖๒๑	๕๑	๔๙๙.๐๒๘๙	๕๙,๐๓๓.๔๙๒๓	๙๓.๑๑
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔

นรม. 6578
เข้า 19/10/65 6.32 น.
ออก 19/10/65 16.03 น.

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	ร้อยละ
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๔๙.๙๙๐๒	๗๔.๔๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๘๗.๗๖๘๕	๑๔		๙,๔๘๘.๔๙๐๘	๙๖.๙๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๖๑๒.๐๒๓๕	๙๔.๙๕
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๒๐**	**-**	**๗๐๔,๗๔๙.๗๑๙๖**	**๙๙.๓๙**
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๗.๕๐๔๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๑๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗**	**๒๐๙,๘๓๒.๗๕๓๐**	**๑,๐๒๓**	**๑๗,๒๑๐.๒๓๓๗**	**๑๘๖,๔๑๐.๕๑๐๖**	**๘๘.๘๔**
๓.๑ แผนงานฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๕๖.๘๘๓๖	๙๒.๙๘
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๐๖๓.๖๕๓๒	๙๙๑		๘,๘๙๓.๐๒๗๑	๘๐.๓๘
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๕๐๕.๙๐๔๘	๘๘.๕๘
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๖,๖๕๔.๖๙๕๑	๙๓.๓๐
รวมทั้งหมด	**๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐**	**๙๘๒,๒๙๐.๗๓๗๔**	**๑,๐๙๔**	**๑๗,๗๐๙.๒๖๒๖**	**๙๕๐,๑๙๓.๗๒๒๕**	**๙๖.๗๓**

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย **ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕** หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว **วงเงินรวม ๙๕๐,๑๙๓.๗๒๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๕๙ โครงการ จาก ๑,๐๙๔ โครงการ)** ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ**โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการฯ) ของ มช. อว.** กรอบวงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

๒) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติให้ มช. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ **จากเดิม**สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **เป็น**สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ มช. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **จากเดิม**สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ **เป็น**สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของผู้ป่วย COVID-๑๙ อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วย COVID-๑๙ อาการหนัก (เคสสีแดง) ที่ต้องเข้ารับบริการจากหอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำรูปแบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ (Specifications) และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดทำรูปแบบรายการละเอียด การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้ชี้แจง (ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑) ที่ผ่านมา รพ. ประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักโควิด (ผู้ป่วยสีแดง) ออกจากพื้นที่โครงการฯ ประกอบกับการก่อสร้างห้อง ICU Mudular เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยเดิม ซึ่ง รพ. ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นั้น มีความล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยแล้วเสร็จและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอด

๑.๒) อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอดฯ Negative pressure แล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๑๕๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือประมาณ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยกำหนดแผนส่งมอบงานและเบิกจ่าย จำนวน ๓ งวดงาน ซึ่งจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดแรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับวงเงินตามงวดงานที่สองและงวดงานที่สาม วงเงินประมาณ ๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖ โดยจะเป็นรายการเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบทางเดินท่ออากาศ

๑.๓) อย่างไรก็ดี รพ. จะรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ โดยจะประสานหารือกับผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รพ. จะพิจารณาแหล่งเงินอื่น ๆ ต่อไป

๒) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง แล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินโครงการเป็นการใช้จ่ายจากแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการที่มีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ รพ. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรณีที่ รพ. ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาดังกล่าว เห็นควรให้ รพ. พิจารณาใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่น ๆ ต่อไป

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ <u>**จากเดิม**</u>สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ <u>**เป็น**</u>สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง เห็นควรมอบหมายให้ มช. เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ **อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ มช. ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เห็นควรให้ มช. พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ** ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เห็นควรให้ มช. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ จังหวัด (ราชบุรี และเชียงใหม่)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๒ จังหวัด (ราชบุรี และเชียงใหม่) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ**โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด** (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ **กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท** โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ **ซึ่งรวมถึงโครงการของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่**

๒) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔๐๙ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๐,๗๕๒๕ บาท **จากเดิม**สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ **เป็น**สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำหรับกลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้างหรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยกเลิกโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๖๗๐ ล้านบาท		
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบทสาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙-บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	๖.๘๙๕๐	**ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินจากเดิม** ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ **เป็น**ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๖.๕๗๒๐	**ขอยกเลิกโครงการ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๑๖๕๖ ล้านบาท		
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าแพะขวาง ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอนบ้านต๋ม-บ้านน้ำบุ่น (ชม.ถ.๑๒๓-๐๓) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑.๑๖๕๖	**ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน**จากเดิมที่กำหนดให้ผูกพันและลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

๒) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยกเลิกโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่ จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒.๒๒๖๐ ล้านบาท		
๑. โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์บริเวณสายป่าไก่-ปากสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๐.๖๖๖๐	**ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕** โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการและไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ส่งผลทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท เป็น ๐.๖๐๑๙ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๖๔๑ ล้านบาท)**

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ข้อเสนอในครั้งนี้
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพรหมนิมิต หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๑.๕๖๐๐	**ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕** โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ และไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ส่งผลทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท เป็น ๑.๔๘๓๑ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๗๖๙ ล้านบาท)**
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๔.๙๖๘๐ ล้านบาท		
๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาเปลี่ยนท่อเมนมิเตอร์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ซับเมอร์ส เจาะบ่อดาล จำนวน ๒ บ่อ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๓.๕๐๐๐	**ขอยกเลิกโครงการ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอน
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งแผงโซล่ารูฟ บ้านแพะคือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๑.๔๖๘๐	

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓)

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ดังนี้

๑.๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ. ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๖.๘๙๕๐ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๒)โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์บริเวณสายป่าไก่-ปากสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕ ไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ และไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท เป็น ๐.๖๐๑๙ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๖๔๑ ล้านบาท)**

๑.๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพรหมนิมิต หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท **โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕** โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก

จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ และไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง **ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท เป็น ๑.๔๘๓๑ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๗๖๙ ล้านบาท)**

๑.๔) ยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๖.๕๗๒๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๒) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกการดำเนินโครงการ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบประปาเปลี่ยนท่อเมนมิเตอร์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ซับเมอร์ส เจาะบ่อดาล จำนวน ๒ บ่อ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินรวม ๓.๕๐๐๐ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งแผงโซล่ารูฟ บ้านแพะคือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินรวม ๑.๔๖๘๐ ล้านบาท เนื่องจากยังไม่เริ่มดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๓) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน **สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าแพะขวาง ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอนบ้านต๋ม-บ้านน้ำบุ่น (ชม.ถ.๑๒๓-๐๓) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงิน ๑.๑๖๕๖ ล้านบาท** เนื่องจากได้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว เห็นควรมอบหมายให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการและยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๒.๓

๔.๓ มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๑๗ ก.ค. ๖๕

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด พิจารณา
๑๗ ก.ค. ๖๕

งานเลขานุการ สศช.
เลขที่รับ 6651
วันที่ - 6 ต.ค. 2565
เวลา 14.37

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขที่รับ 10990
วันที่ - 6 ต.ค. 2565
เวลา 10.35

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๕.๓/ ๒๑๕๙๔

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว ๘๓๙๒(๕)/๙๑๐๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ ๑) ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะขอและได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าวมาแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆ อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีผู้ป่วย COVID-๑๙ อาการหนัก (เคสสีแดง) ที่เข้ารับการบริการจากหอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อจัดทำแบบรูปรายการละเอียด รายการประกอบแบบ (Specifications) และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ได้ จึงทำให้เกิดความล้าช้าในกระบวนการจัดทำแบบรูปรายการละเอียดและส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล้าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด **รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจากเดิมกำหนดสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาต่อไป เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๕๐๔๒

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 1838 เวลา
วันที่ 07 ต.ค. 2565

กองอุทรดำเนินการแทนเลขาธิการ
เลขรับ 1536
วันที่ 26 ก.ย. 65
เวลา 11.13

สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เลขรับ 33344
วันที่ 26 ก.ย. 2565
เวลา 9.54 น.

ที่ อว ๘๓๙๒(๕)/๙๑๐๕

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ๑๑๗๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสงค์จะขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท **จากเดิมสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖** เนื่องจากในปัจจุบันมีการระบาดของผู้ป่วย COVID-๑๙ อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วย COVID-๑๙ อาการหนัก (เคสสีแดง) ที่เข้ารับการการบริการจากหอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อจัดทำแบบรูปรายการละเอียด รายการประกอบแบบ (Specifications) และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดทำแบบรูปรายการละเอียด และส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า และขอรายงานความก้าวหน้าของงาน ดังนี้

๑ ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยหนักโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (ICU MODULAR) เพื่อใช้รองรับผู้ป่วย COVID-๑๙ ทดแทนหอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒ เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ICU MODULAR เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คาดว่าแล้วเสร็จประมาณกันยายน ๒๕๖๕

/๓ เปิดใช้ ICU MODULAR.....

๓ เปิดใช้ ICU MODULAR ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการย้ายผู้ป่วย COVID-๑๙ ออกจากหอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ คาดว่าแล้วเสร็จประมาณตุลาคม ๒๕๖๕

๔ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ เพื่อจัดทำรูปแบบรายการโดยละเอียดพร้อมประมาณราคางานปรับปรุงฯ (BOQ) และรายการประกอบแบบงานปรับปรุงฯ แล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๕ ดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ (จำนวน ๑๑ ห้อง) คาดว่าแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑. การขอจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๒. การลงนามในสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๖ ดำเนินการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ (จำนวน ๑๑ ห้อง) คาดว่าแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณาต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานมหาวิทยาลัย
กองแผนงาน
โทร. เชียงใหม่ ๐ ๕๓๙๔ ๓๑๕๓
กรุงเทพฯ ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๑ - ๒
โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๑๑๔๗

แบบฟอร์มที่ 2

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
รายงานข้อมูลภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

แผนงานหลัก

✓ กลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

o กลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

o กลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2 ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัส Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

3 แผนงานหรือโครงการรอง_____

4 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของ Corona virus ที่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน และเกิดความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจไปทั่วโลก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รับดูแลผู้ป่วยนอก มากกว่า 1.3 ล้าน รายต่อปี และผู้ป่วยใน กว่า 50,000 รายต่อปี ในการรับมือการระบาดครั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการรับมือกับการระบาดของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

ที่ผ่านมา ในการระบาดระลอกที่ 1 เชียงใหม่ มีการติดเชื้อ 40 ราย และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยของจังหวัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และในขณะนี้ ด้วยมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามโอกาสการระบาดระลอกที่ 2 ในเชียงใหม่ มีสูงมาก เนื่องด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆในภาคเหนือ หากมีการระบาด และใช้ศักยภาพเดิมอาจส่งผลกระทบต่อการบริการปกติของโรงพยาบาล เนื่องจากห้องความดันลบ และแหล่งพักฟื้นผู้ป่วย ไม่สามารถใช้สถานที่ร่วมกันกับผู้ป่วยปกติได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการรับการระบาดดังกล่าว เพื่อให้สามารถให้การดูแลทั้งผู้ป่วยโคโรนาไวรัส Covid-19 และผู้ป่วยทั่วไปได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1 เพื่อจัดหาชุดตรวจไวรัส Covid -19 ให้ครอบคลุมการตรวจผู้ป่วยทุกระยะ

5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ทางการแพทย์ หอผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด ห้องพักผู้ป่วย/สถานที่รองรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส Covid-19 ทั้งระบบ

5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคอื่นๆที่มาทำการรักษาได้อย่างปลอดภัย

6 แผนและผลการดำเนินงาน (กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ)

งานปรับปรุงห้อง Negative Pressure หอผู้ป่วย cohort ward ชั้น 4 อาคารตะวันกังวานพงษ์ (จำนวน 15 ห้อง)

กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						รวมระยะเวลา
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
จัดซื้อ/จัดจ้าง														
1. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	แผน													2 เดือน
	ผล													2 เดือน
2. ประกวดราคา	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน
งานก่อสร้าง														
1. งานแบบก่อสร้าง	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน
2. งานรื้อถอน	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน
3. งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	แผน													5 เดือน
	ผล													5 เดือน
4. งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แผน													2 เดือน
	ผล													2 เดือน
5. งานระบบระบายกากาศและปรับอากาศ	แผน													3 เดือน
	ผล													3 เดือน
6. งานระบบแก๊สทางการแพทย์	แผน													3 เดือน
	ผล													3 เดือน
7.ทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่	แผน													3 เดือน
	ผล													3 เดือน
8. ตรวจรับงาน	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน

งานปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ (จำนวน 11 ห้อง)

กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												ปีงบประมาณ พ.ศ.2566					รวมระยะเวลา
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
จัดซื้อ/จัดจ้าง																									
1. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	แผน																								2 เดือน
	ผล																								
2. ประกวดราคา	แผน																								1 เดือน
	ผล																								
งานก่อสร้าง																									
1. งานแบบก่อสร้าง	แผน																								5 เดือน
	ผล																								5 เดือน
2. งานรื้อถอน	แผน																								1 เดือน
	ผล																								
3. งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	แผน																								4 เดือน
	ผล																								
4. งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แผน																								3 เดือน
	ผล																								
5. งานระบบระบายอากาศและปรับอากาศ	แผน																								3 เดือน
	ผล																								
6. งานระบบแก๊สทางการแพทย์	แผน																								3 เดือน
	ผล																								
7.ทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่	แผน																								2 เดือน
	ผล																								
8. ตรวจรับงาน	แผน																								1 เดือน
	ผล																								

งานปรับปรุงห้อง Negative Pressure ห้องผ่าตัด ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน (จำนวน 2 ห้อง)

กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						ระยะเวลา
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
จัดซื้อ/จัดจ้าง														
1. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	แผน													2 เดือน
	ผล													2 เดือน
2. ประกวดราคา	แผน													1 เดือน
	ผล													2 เดือน
งานก่อสร้าง														
1. งานแบบก่อสร้าง	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน
2. งานรื้อถอน	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน
3. งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	แผน													5 เดือน
	ผล													5 เดือน
4. งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แผน													3 เดือน
	ผล													3 เดือน
5. งานระบบระบายอากาศและปรับอากาศ	แผน													3 เดือน
	ผล													3 เดือน
6. งานระบบแก๊สทางการแพทย์	แผน													3 เดือน
	ผล													3 เดือน
7. ทดสอบระบบ	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน
8.ทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน
9. ตรวจรับงาน	แผน													1 เดือน
	ผล													1 เดือน

7 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

7/1 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 1 และ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	มติ ครม. วงเงิน	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												ปีงบประมาณ พ.ศ		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.ปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วย Cohort ward ชั้น 4 อาคารตะวัน กังวานพงษ์ (จำนวน 15 ห้อง)	14.0000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6000	7.4000	-	-	-	-	-	-				-
		แผนปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3000	7.7000									
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3000	7.7000									
2.ปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ (จำนวน 11 ห้อง)	11.0000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-	-				-
		แผนปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											3.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3.ปรับปรุงห้อง Negative pressure ห้องผ่าตัด ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน (จำนวน 2 ห้อง)	24.0000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5100	6.5100	10.9800	-	-	-	-	-	-				-
		แผนปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5100	6.5100	8.6800									
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5100	6.5100	8.6800									
4.ชุดตรวจไวรัส Covid-19 (จำนวน 1 ชุด)	2.0000	แผน	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
		แผนปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
		ผล	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
รวม	51.0000	แผน	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	6.5100	13.1100	29.3800	-	-	-	-	-	-				-
		แผนปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	6.5100	9.8100	16.3800	-	-	-	-	-	-	-		3.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	6.5100	9.8100										

7/2 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่

รายการ	มติ ครม. วงเงิน	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												รวม	
			เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ก.ย. พ.ย.					
			ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		แผน														
		ผล														
กลุ่มที่ 1 เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ปี)		แผน														
		ผล														
กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ		แผน														
		ผล														
กลุ่มที่ 3 ผู้พิการ		แผน														
		ผล														
รวม		แผน														
		ผล														

8 สถานะโครงการ

1.ปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วย Cohort ward ชั้น 4 อาคารตะวัน กังวานพงษ์ (จำนวน 15 ห้อง) ดำเนินการปรับปรุงฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.ปรับปรุงห้อง Negative pressure ห้องผ่าตัด ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน (จำนวน 2 ห้อง) ดำเนินการปรับปรุงฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.ปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ (จำนวน 11 ห้อง) อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ งานปรับปรุงฯ

9 ปัญหา/อุปสรรค

1. ปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ (จำนวน 11 ห้อง)เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อจัดทำแบบรูปรายการละเอียด รายการประกอบแบบ (Specifications) และปริมาณงาน(BOQ) ได้จึงทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดทำแบบรูปรายการละเอียด และส่งผลให้การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง(TOR) และการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความล่าช้าขึ้น

10 แนวทางแก้ไข

1. ปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ (จำนวน 11 ห้อง) วางแผนดำเนินงาน โดยจะก่อสร้าง ICU MODULAR เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ระหว่างการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์

ชื่อ-สกุล ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 089-7551127
E-mail nchotiro@gmail.com

อาคารหอผู้ป่วยหนักโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (ICU Modular) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

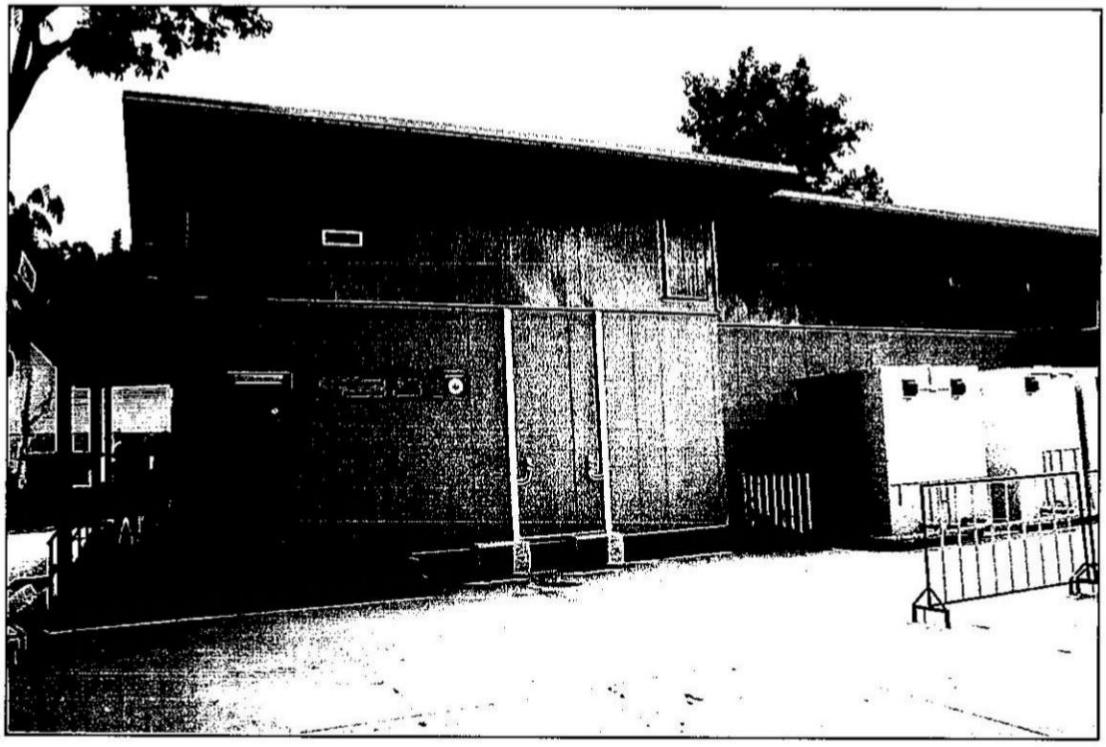

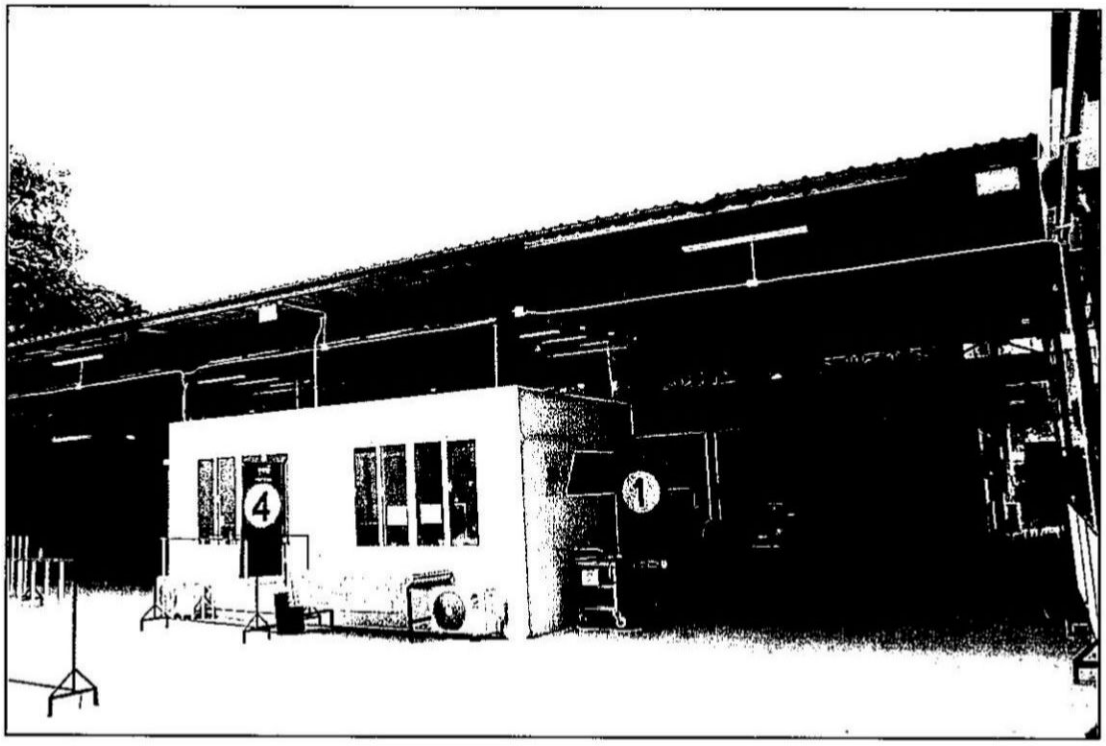
4
1

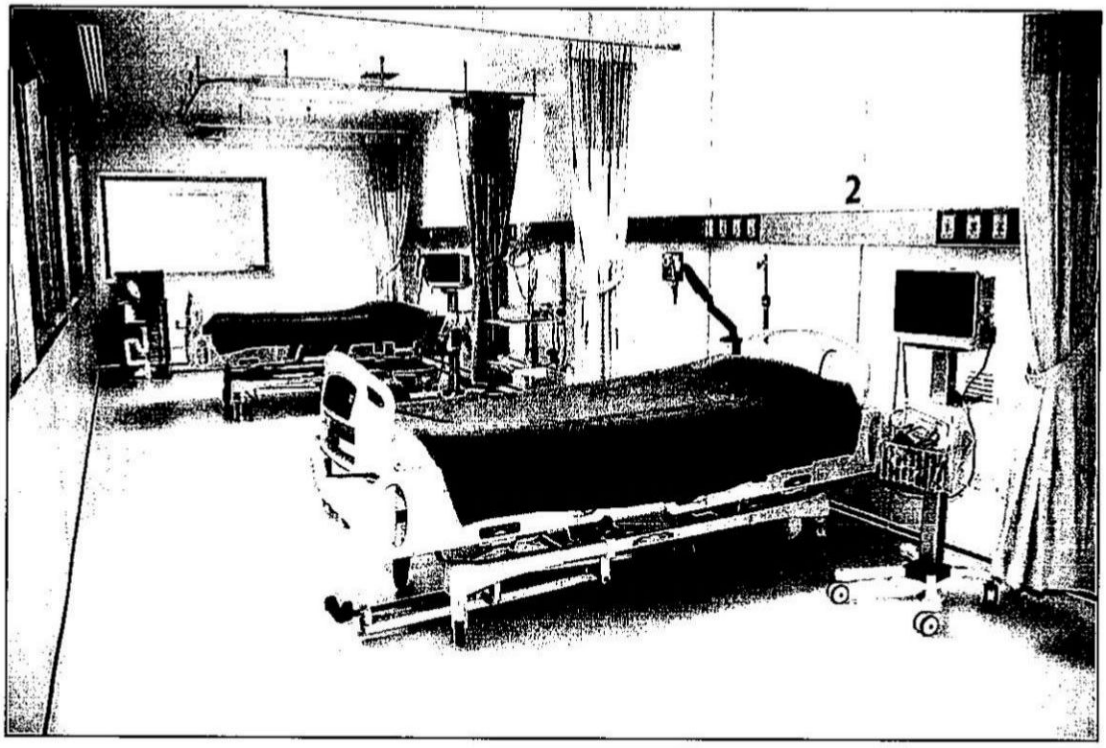
2

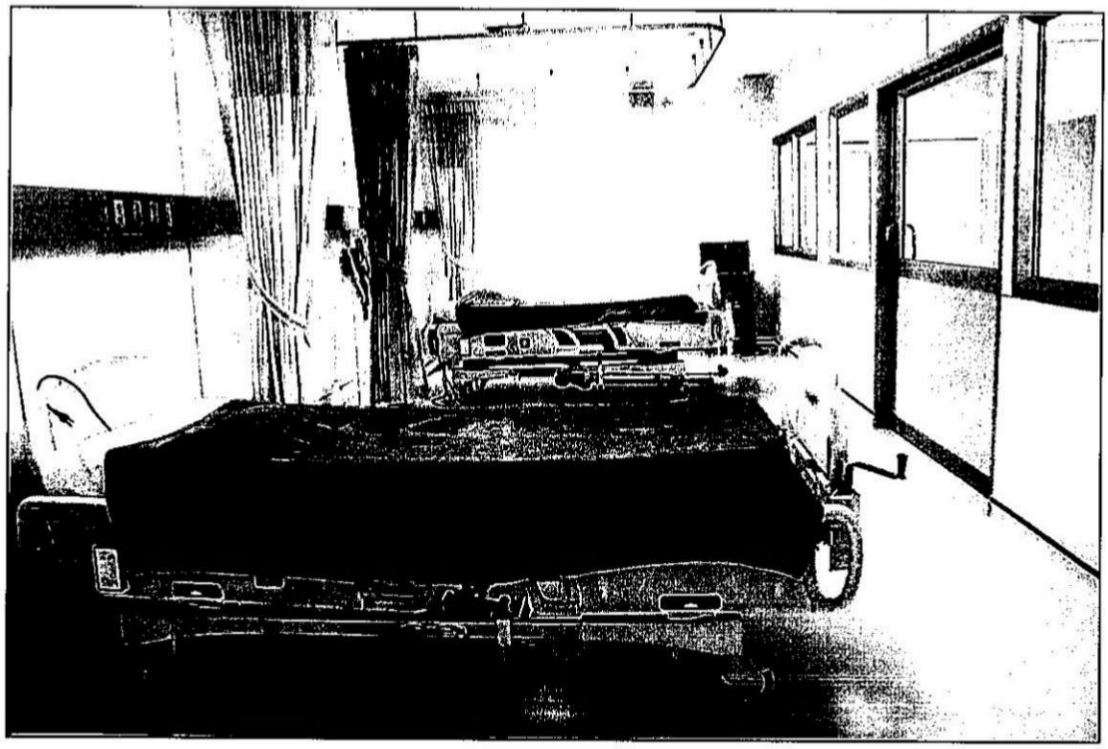

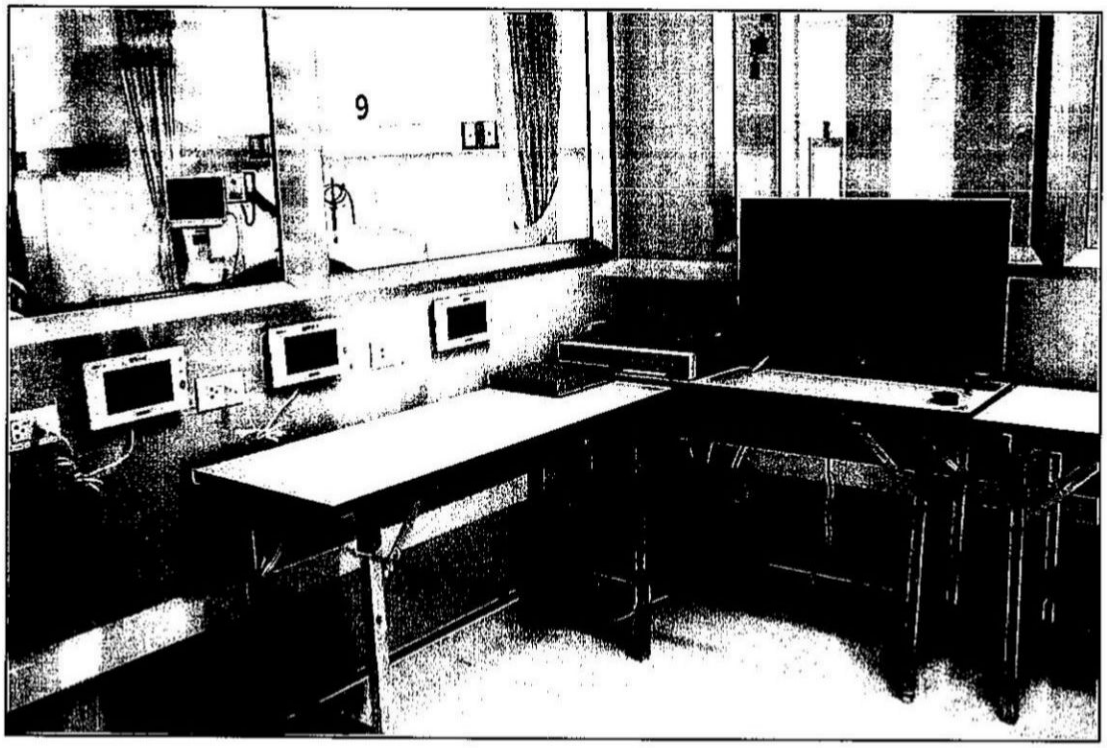
9

ภาพรวมการใช้บริการของผู้ป่วย covid

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับการตรวจช่วงโควิด-19 ห้องตรวจ EID

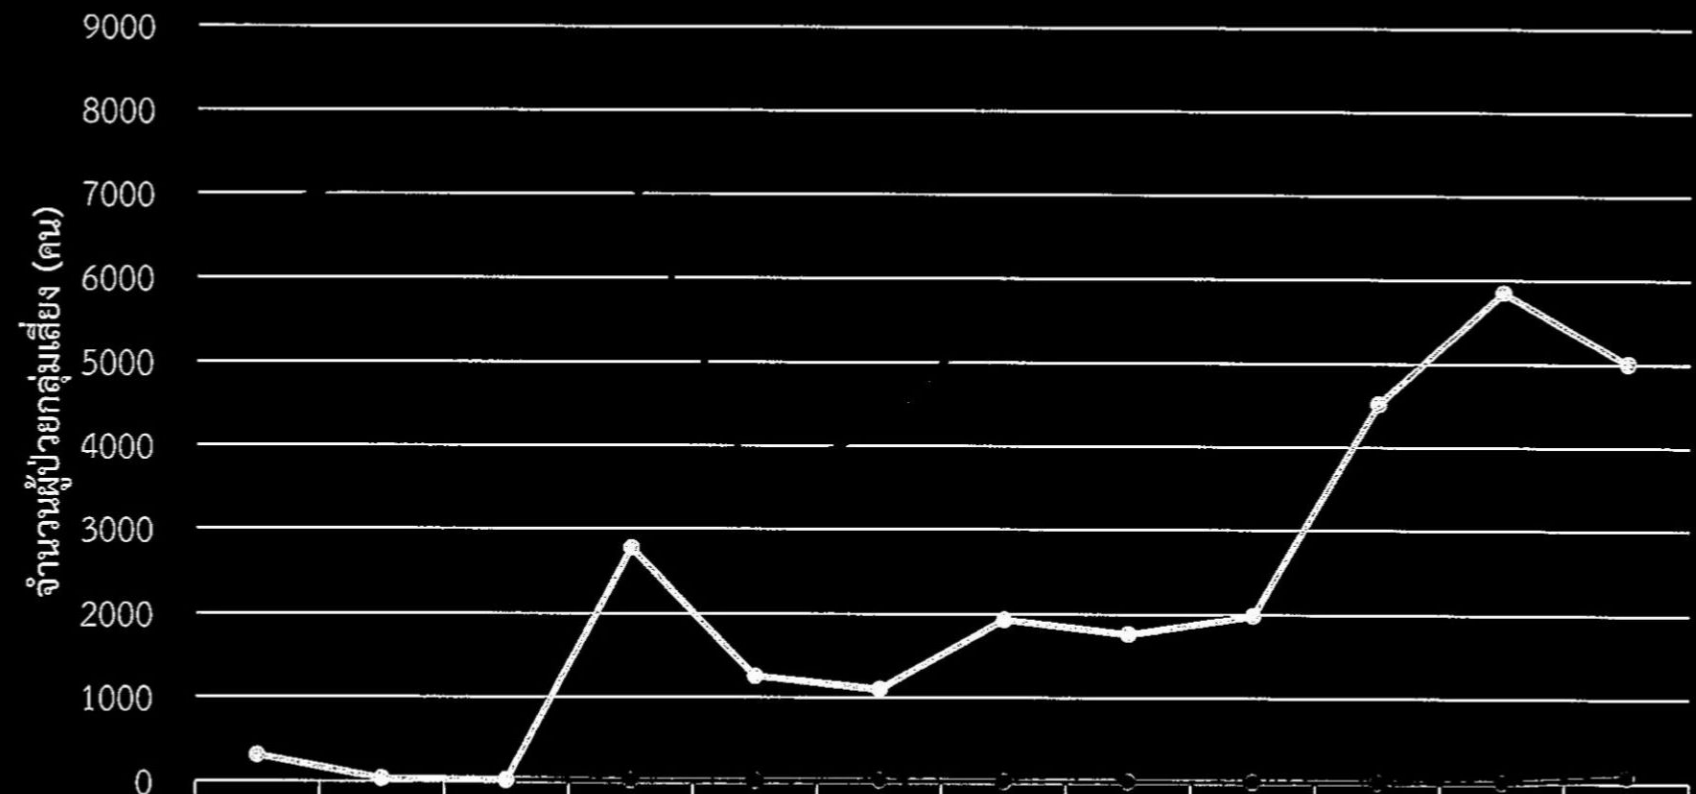

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปี 2563			14	7	6	11	-	-	-	-	2	65
ปี 2564	308	31	13	2,770	1,247	1,093	1,933	1,759	1,983	4,519	5,846	5,001
ปี 2565	6,772	7,272	7,869	7,158	3,456	4,254	5,721					

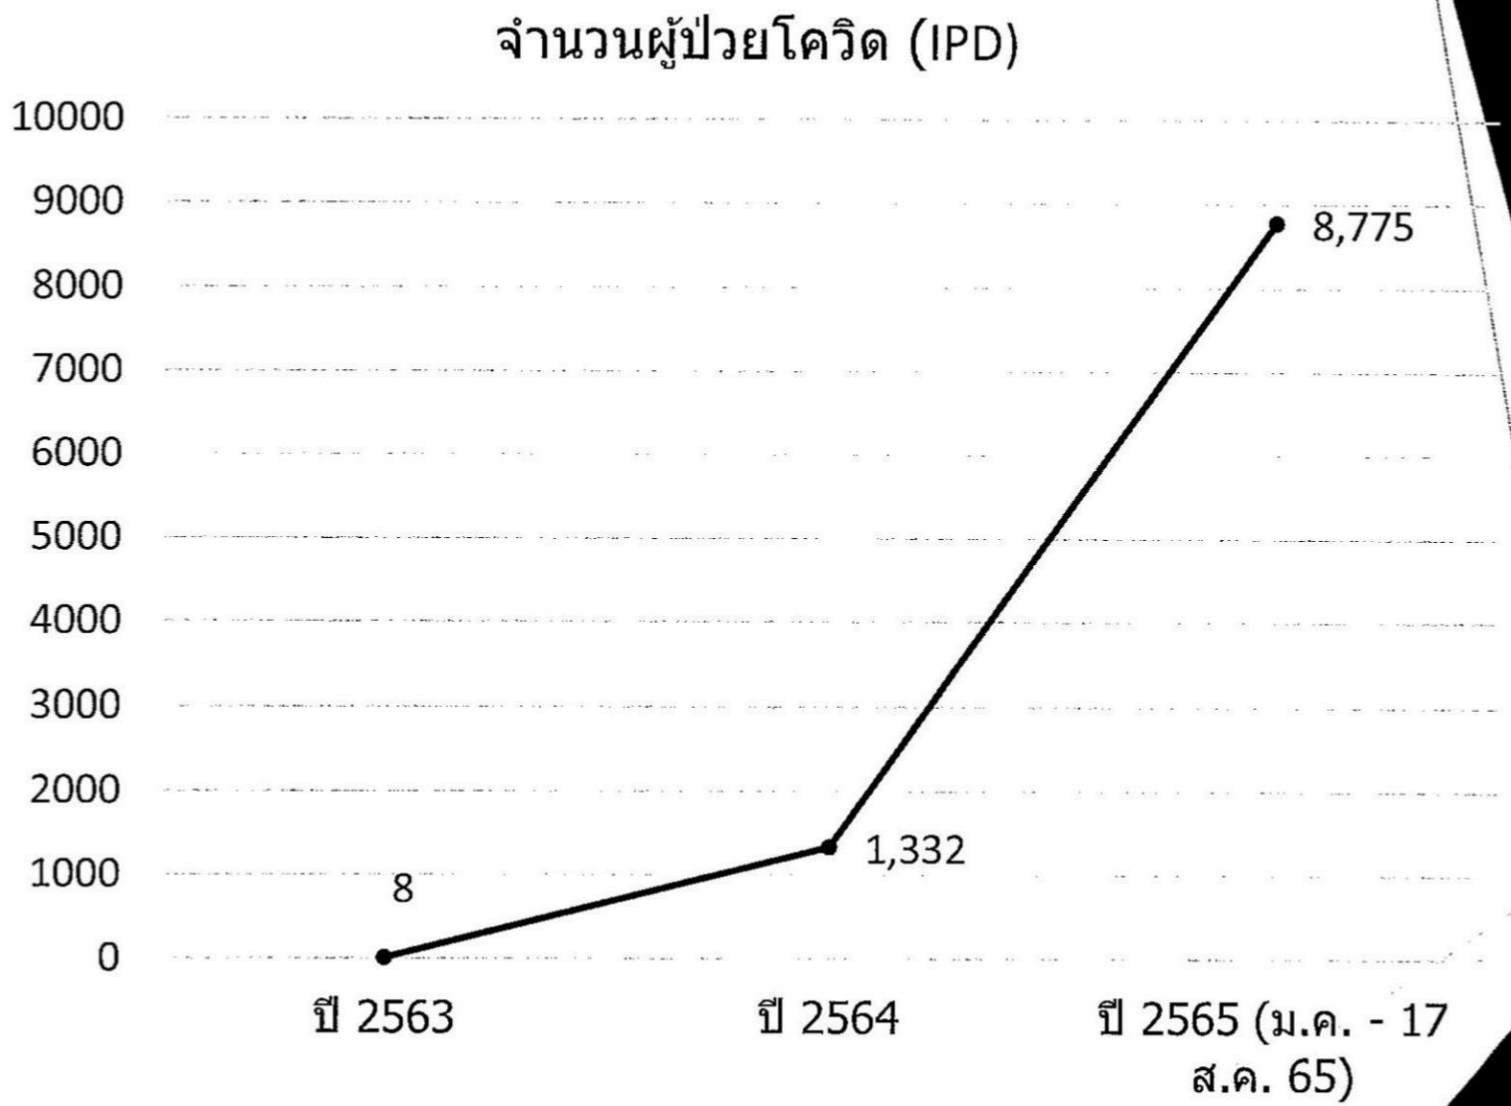
จำนวนผู้ป่วยโควิด (IPD)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
8
1,332
8,775
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 (ม.ค. - 17 ส.ค. 65)

หอผู้ป่วยโรคปอด

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.
ปี2563	1	1	6	5								
ปี2564	1	0	0	67	44	13	38	28	31	88	60	40
ปี2565	52	63	0	74	57	30	76					

ภาพรวมการใช้บริการงบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

- งานปฏิบัติการชันสูตร
- หอผู้ป่วยตะวัน 4 (Cohort Ward)
- ห้องผ่าตัด

งานปฏิบัติการชันสูตร

- งบประมาณที่ได้รับจำนวน 2,000,000 บาท
- ใช้จัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ SAR-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR
- น้ำยาตรวจวิเคราะห์ชื่อ DAAN Gene 2019-nCov RT-PRC kit
- ขนาดบรรจุ 96 tests/กล่อง
- สั่งซื้อเมื่อ เดือน กรกฎาคม 2564 รวมจำนวน 27 กล่อง <u>เฉลี่ยราคากล่อ</u>

  <u>74,074.07 บาท</u> ใช้ตรวจวิเคราะห์ได้ <u>2,594</u> ราย

สถิติส่งตรวจเดือน กรกฎาคม 2564 3,368 ราย

สถิติส่งตรวจเดือน สิงหาคม 2564 3,083 ราย

เดือนกรกฎาคม 2564 ใช้เงินส่วนนี้จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Covid-19 เป็นเดือนที่ 4 ที่มีจำนวนส่งตรวจเพิ่มขึ้นกว่า 20 เท่าของสถิติส่งตรวจเดือนมีนาคม 2564 ทำให้เงินจากประมาณการจัดซื้อน้ำยามีประมาณการไว้มีไม่เพียงพอ ซึ่งเงินกู้จากโครงการนี้ทำให้สามารถจัดซื้อน้ำยามาใช้ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ Covid-19ได้อย่างต่อเนื่อง

สถิติการส่งตรวจ SARS-CoV-2 (ราย) หน่วยปฏิบัติการจุลชีววิทยา งานปฏิบัติการชันสูตร
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2567

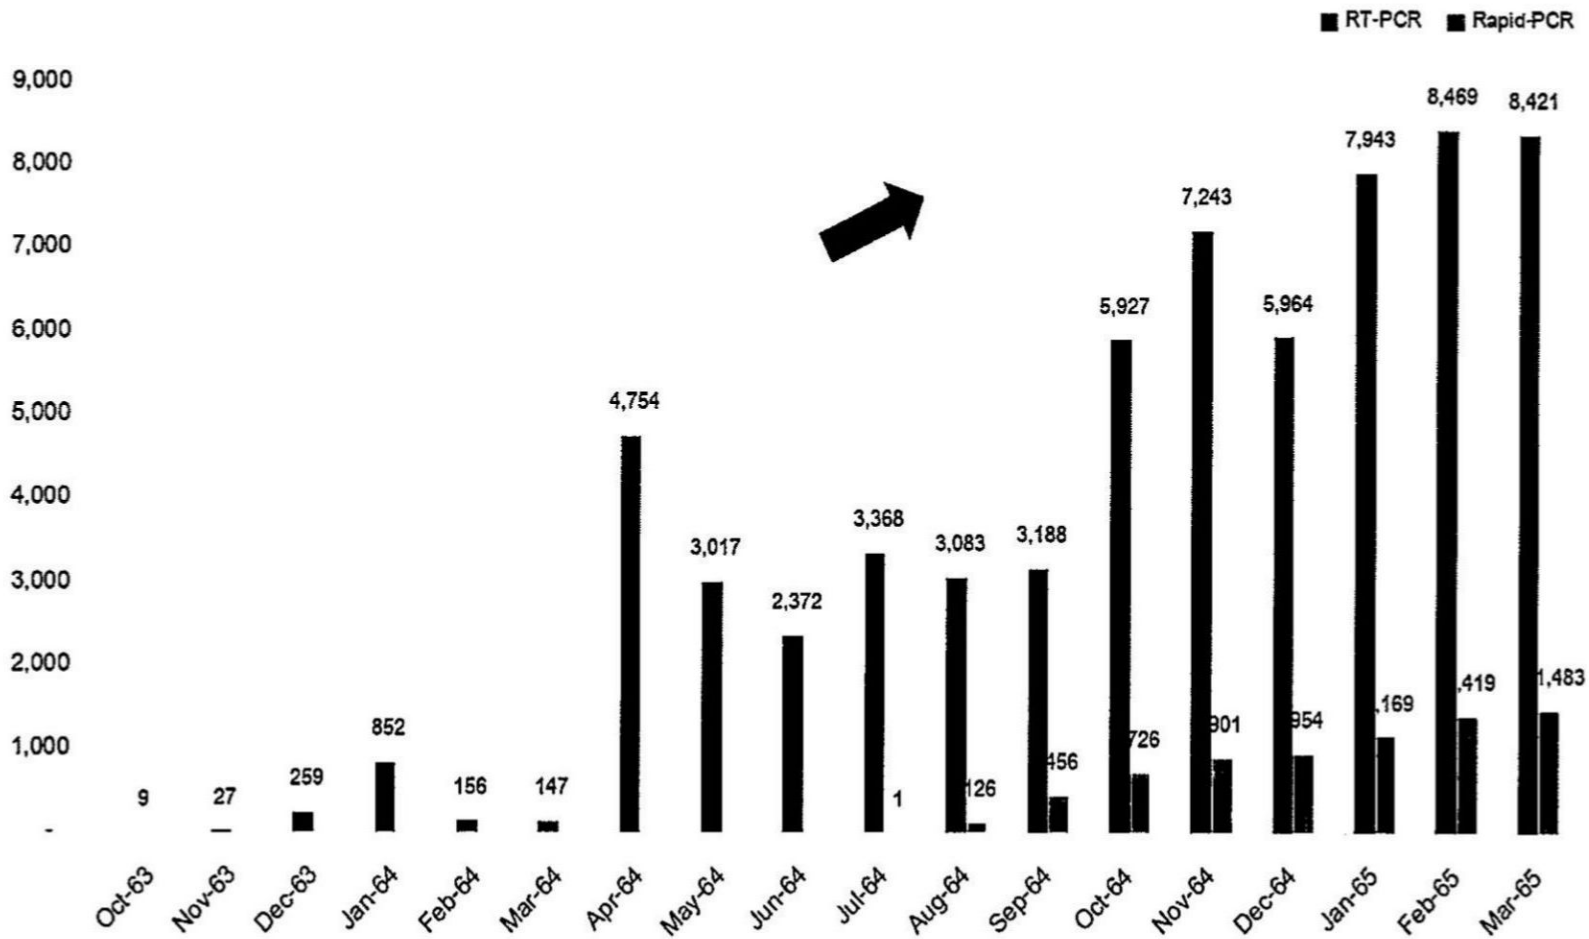

หอผู้ป่วยตะวัน 4 (Cohort Ward)

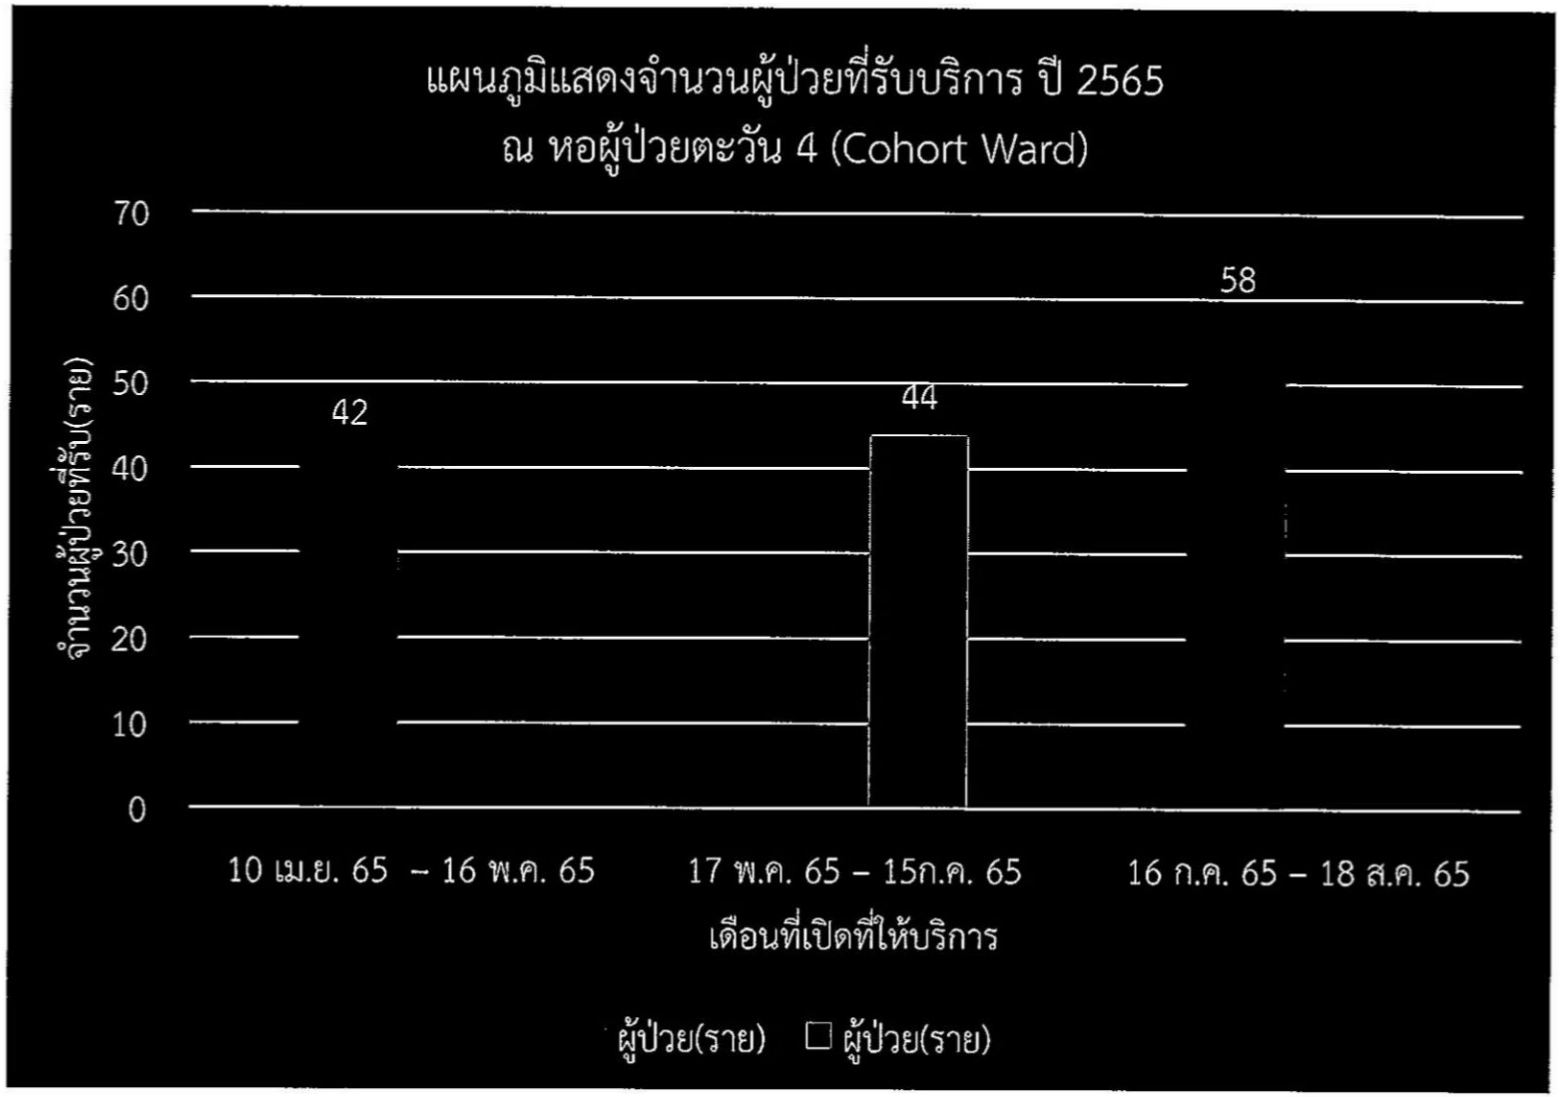

สถิติผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ารับการผ่าตัด
ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 123 ราย

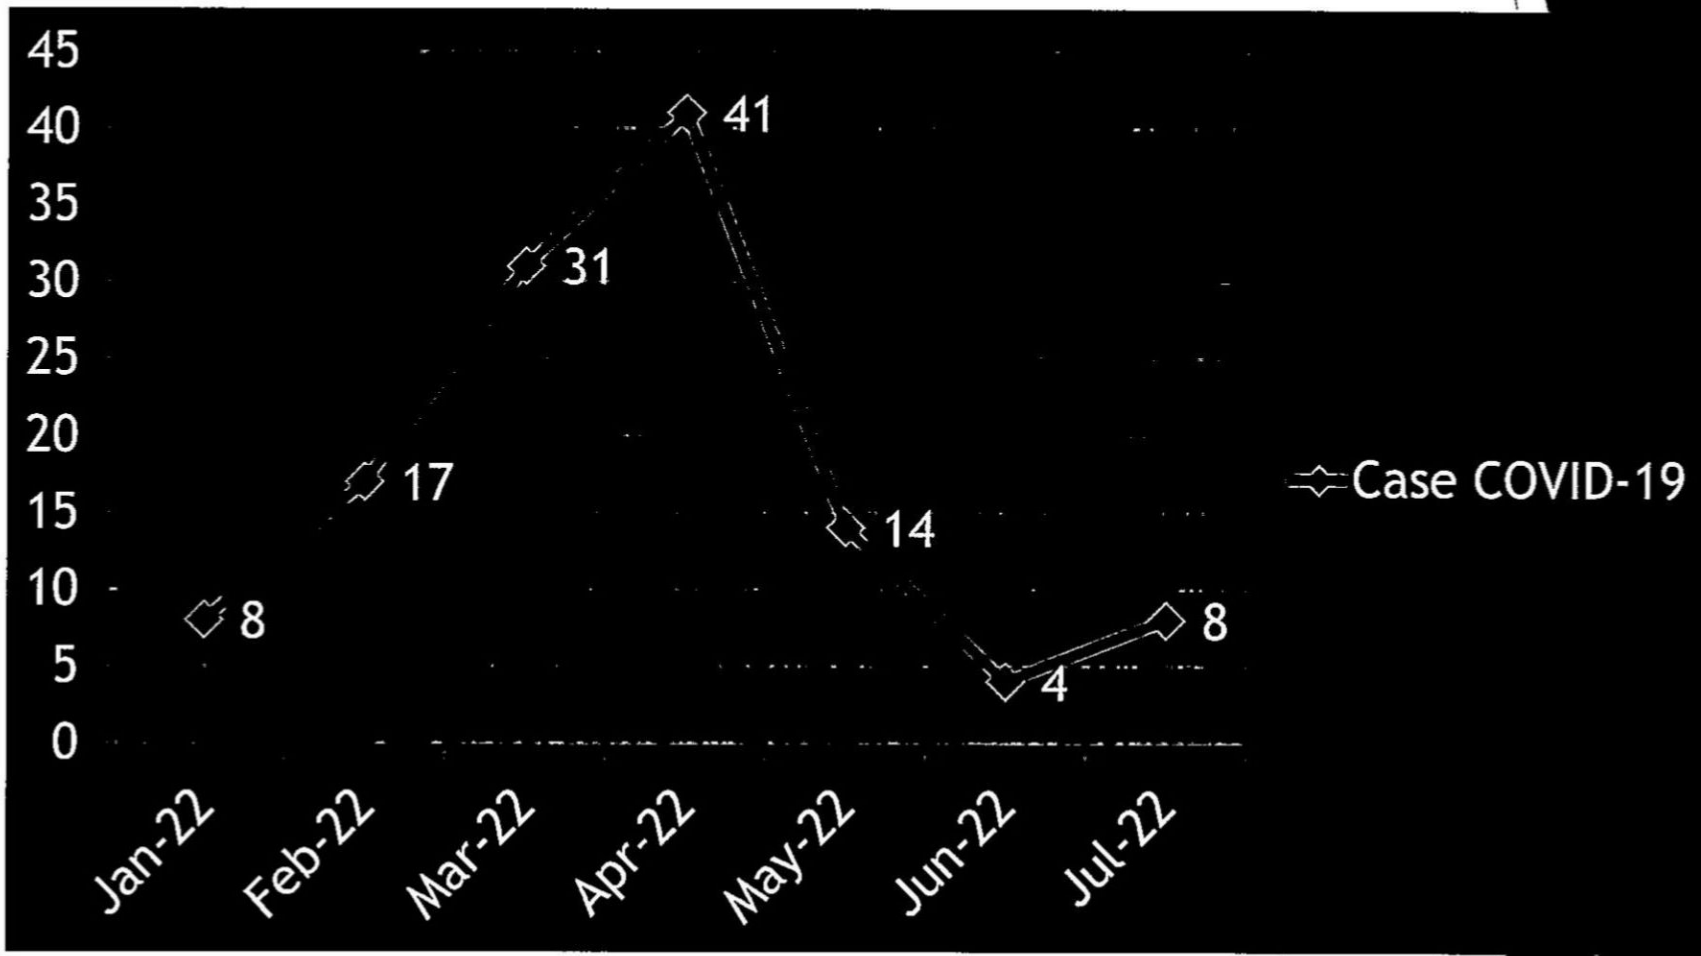

สถิติการใช้ห้องผ่าตัด

Negative Room1 และ Negative room 2

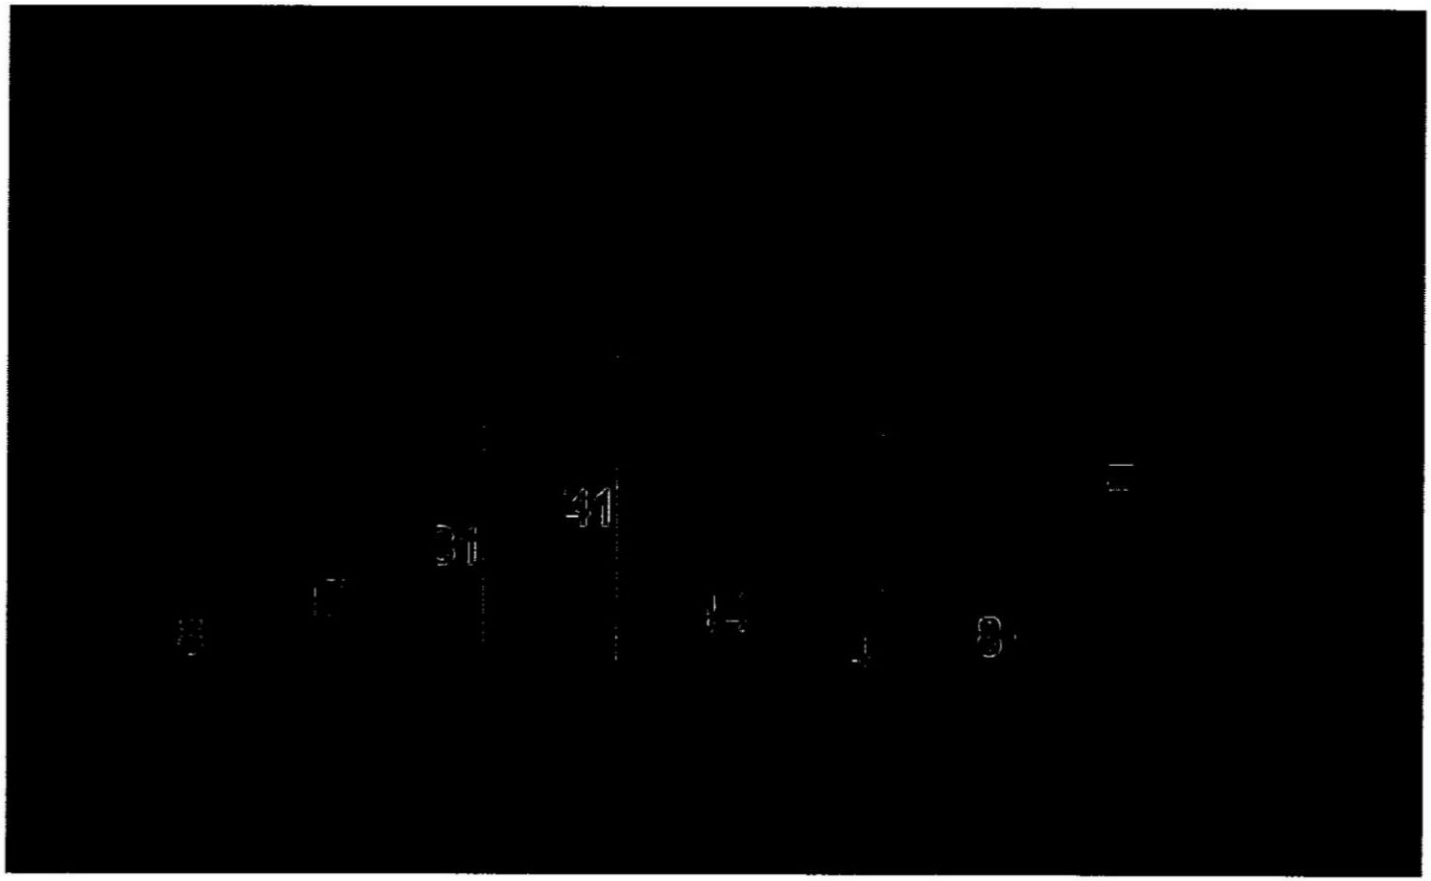

งานเลขานุการ สศช.
เลขที่รับ 5841
วันที่ 5 ก.ย. 2565
เวลา 14.28

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 9418
วันที่ 29 ส.ค. 2565
เวลา 11.18 น.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๒๕๑๖๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๕/๒๘๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ แจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการฯ ของจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ แล้ว จึงขอแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 1644 เวลา
วันที่ 12 ก.ย. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ มท. ๕๐๕๒๕

Change for Good

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๖๓๙๙

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 10705
วันที่ 29 ก.ย. 2565
เวลา 13.41

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๕/๒๘๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ แจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ แล้ว จึงขอแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

QR code สำหรับ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ มท. ๕๐๕๒๕

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 1770 เวลา
วันที่ 30 ก.ย. 2565

Change for Good

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๗/ ๑๕๗๕๒

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๗๑๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว หรือยกเลิกกิจกรรมแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

/๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๔
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: pipf๑@pdmo.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒๒๓๙๒

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๑๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยเฉพาะการอนุมัติให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๗๖
โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๐/๕๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๑๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ

๒. อนุมัติให้จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการและยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

๓. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ รวมทั้งเห็นชอบให้จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ ตลอดจนมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย ควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๙๐๓/๓๓๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๑๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญและยกเลิกการดำเนินโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดราชบุรี ๔ โครงการ และจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โครงการ) โดยเป็นการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างและปรับลดกรอบวงเงิน และขอยกเลิกโครงการเนื่องจากยังไม่เริ่มดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จและปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

๒. การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าแพะขวางฯ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามผูกพันสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเป็นกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้กำหนดให้เสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการ กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาเห็นชอบได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง
ฝ่ายกฎหมายการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๑๓๘๓ (นางสาวสุพิชชาฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๖๒๕๙

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๑๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. อย่างไรก็ดี เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเร่งปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ให้เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: Phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
